



APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF)

Aquisições e
Obras
Em execução

PRECATÓRIO DO FUNDEF

É fruto de decisão judicial (acordo homologado) no bojo dos autos nº 0001863-24.2013.4.01.3701 que tramitou perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz - MA e conforme Acórdão nº 2866/2018 lavrado pelos Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno/TCU.

REDE DE FISCALIZAÇÃO

Criada em 26 de julho de 2019 - Portaria nº 027/2019

Objetivo:

Fiscalização para acompanhamento da execução do plano de aplicação dos recursos referentes ao precatório do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef/Fundeb.

Constituída por: Procuradoria Geral do Município; Câmara Municipal; Ministério Público Estadual; Conselho do Fundeb; Conselho Municipal de Educação; Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Imperatriz, Tribunal de Contas Estadual e Associação dos Gestores das Escolas Municipais.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA SEMED N.º 027 DE 26 DE JULHO DE 2019.

Cria a rede de fiscalização para o acompanhamento da execução do plano de aplicação dos recursos vindos dos créditos do Fundeb/Fundef (precatório).

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, no uso de suas atribuições legais previstas no Art. 55 da Lei Orgânica Municipal e Art. 55 da Lei Ordinária n.º 1.235/2007.

RESOLVE:

Art. 1.º Criar a rede de fiscalização no âmbito dessa Secretaria de Educação para o acompanhamento da execução do plano de aplicação dos recursos vindos dos créditos do Fundeb/Fundef (precatório), em respeito a decisão judicial (acordo homologado) no bojo dos autos nº 0001863-24.2013.4.01.3701, em trâmite na 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz - MA e ACÓRDÃO N.º 2866/2018 – TCU – Plenário.

Art. 2.º A rede de fiscalização é constituída pelas seguintes pessoas e entidades: Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município, Ministério Público Estadual, Câmara Municipal de Imperatriz, Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino em Imperatriz, (STEEI), Conselho do Fundeb (previsto no artigo 24 da Lei 11.494/2007), Conselho Municipal de Educação, Tribunal de Contas Estadual, representante dos diretores das escolas (AGESMI), representante dos estudantes (UMES), e representante dos pais dos estudantes.

Art. 3.º Visando dar a mais ampla divulgação, à luz do princípio constitucional da publicidade, todas as instituições e pessoas referidas no Art. 2.º deverão ser convidadas para o acompanhamento na execução do plano de aplicação dos recursos.

Art. 4.º Esta portaria entra vigor na data de sua publicação nos placares da Secretaria Municipal de Educação, revogando todas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário de Educação, Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 26 de julho de 2019, 198º ano da Independência e 131ª da República.


José Ferreira
Secretário de Educação

Aprovação do Plano de aplicação dos recursos por meio do Decreto nº 49/2019



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 049 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.

"APROVA O PLANO DE APLICAÇÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO PRECATÓRIO ORIUNDO DE DIFERENÇAS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF, DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."


O PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que se dispõe os acórdãos 1.824/2017, 1.962/2017, 2.866/2018 e 180/2019, todos do Plenário do TCU.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Aplicação dos créditos decorrentes do precatório de diferenças das transferências do FUNDEF, para o exercício de 2019 e seguintes, conforme constante do anexo único deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, EM 01 DE OUTUBRO DE 2019, 199º ANO DA INDEPENDÊNCIA E 131ª DA REPÚBLICA.


FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS
PREFEITO MUNICIPAL

- Ampla divulgação da rede de fiscalização e aplicação do Plano no endereço eletrônico oficial da Prefeitura:

<http://www.imperatriz.ma.gov.br/pmi/comunicados/sememd/rede-de-fiscalizacao-fundebfundef/>

- Publicação do Plano de Aplicação na íntegra.

Comunicados

Educação

C-318

Portaria

Publicado em: 26/07/2019 - Atualizado em: 26/07/2019

Rede de fiscalização Fundeb/Fundef

Cria a rede de fiscalização para o acompanhamento da execução do plano de aplicação dos recursos vindos dos créditos do Fundeb/Fundef (precatório)



Portaria



Recomendação dos órgãos de controle sobre aplicação do recurso referente ao precatório do Fundeb/Fundef



DECRETO Nº 049 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019



PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF

Compartilhe:




PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PRECATÓRIO DO FUNDEF

<https://d2uzqu0gkpnx87.cloudfront.net/site/notify/semec/portaria/Plano de aplicac%0C3%A7%0C3%A3o dos cr%0C3%A9ditos do FUNDEF.pdf>

O Plano vai sendo aplicado mediante aprovação da Rede de Controle (Conselho do Fundef);

Já foram realizadas 05 (cinco) Reuniões - registradas em ATA, assinadas pelos representantes de órgãos e entidades da sociedade civil.

O Plano recebe ajustes a partir das necessidades de cada execução dos projetos e deliberados em Conselho.



OBRAS |

CONSTRUÇÃO DO ZERO PREVISÃO DE ENTREGA EM 50 DIAS

Escola do HABITAR BRASIL - capacidade para 800 alunos

08 SALAS DE AULA

Setor administrativo

Quadra coberta

Pátio coberto

Contrato: 61/2020

Valor: R\$ 2.664.057,55

VALOR PAGO – 40% da obra

1ª Medição - 419.437,54

2ª Medição – 364.386,46

3ª Medição – 419.437,54



CONSTRUÇÃO DO ZERO PREVISÃO DE ENTREGA – 60 DIAS

Escola do SEBASTIÃO RÉGIS

capacidade para 1.000 alunos

10 salas de aula, Setor administrativo

Quadra coberta, Pátio coberto

Contrato: 72/2020

Valor: R\$ 2.993.083,34

VALOR PAGO - 25% da obra

1ª Medição – 463.314,57

2ª Medição – 269.232,05



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal Tocantins – CONCLUÍDA

08 Salas de aula, Refeitório, Cozinha, Setor administrativo, Biblioteca, Sala de robótica
Área de vivência

Contrato: 46/2020

Valor: R\$ 764.672,69

VALOR PAGO – 74% da obra

1º Medição - R\$124.281,44

2º Medição - R\$206.278,49

3º Medição - R\$230.945,16



ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS

ANTES



ESCOLA MUNICIPAL TOCANTINS

DEPOIS



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal **SANTA MARIA**

Elevação do piso e paredes

06 salas de aula

Sala de recursos, Biblioteca, Informática

Cozinha com refeitório, Pátio coberto

Contrato: 146/2020

Valor: R\$ 736.016,42

VALOR PAGO – 20% da obra

1ª Medição - R\$26.542,09

2ª Medição - R\$111.719,43



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal **SANTA RITA**

Elevação do piso e paredes, drenagem do córrego

04 salas de aula

Biblioteca, Sala de informática, Setor administrativo, Banheiros

Contrato: 45/2020

Valor: R\$ 569.882,32

Aditivo: 248.618,30 (drenagem)

VALOR PAGO - 23% da obra

1º Medição - R\$36.245,37

2º Medição - R\$120.499,83

3º Medição - R\$38.166,41



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal **MUTIRÃO**

07 salas de aula (04 novas)

Sala de recurso, laboratório de informática, biblioteca

Refeitório, setor administrativo

Cobertura da quadra

Contrato: 48/2020

Valor: R\$ 1.099.469,79

Aditivo: 469.993,01 (recuperação da quadra e cobertura)

VALOR PAGO - 26% da obra

1º Medição - R\$141.636,19

2º Medição - R\$130.349,65

3º Medição - R\$151.085,43



REFORMA E AMPLIAÇÃO

EMEI EDELVIRA MARQUES

08 salas de aula com banheiro (02 novas)

Cobertura do teatro ao ar livre

Elevação do muro

Revitalização de todo o prédio

Contrato: 47/2020

Valor: R\$ 419.719,08

Aditivo: 172.397,12

VALOR PAGO - 36%

1º Medição - R\$63.360,03

2º Medição - R\$83.291,61

3º Medição - R\$70.607,57



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal de Educação Infantil **JAIR ROSIGNOLI**

10 salas de aula com banheiro (04 novas)

Área de vivência, muro refeito

revitalização de todo o prédio

Contrato: 141/2020

Valor: R\$ 451.377,81

VALOR PAGO – 24% da obra

1º Medição – 108.577,7



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal **DARCY RIBEIRO**

21 salas de aula, Sala de recursos, Biblioteca, Sala de informática

Revitalização da quadra (cobertura e banheiros novos)

Telhado revitalizado

Refeitório, climatização

Contrato: 144/2020

Valor: R\$ 2.113.971,09

VALOR PAGO – 30% da obra

1º Medição - R\$249.804,17

2º Medição - R\$398.537,03



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal **ELISA NUNES**

17 salas de aula (05 novas)

Biblioteca, sala de recursos, robótica, sala de mídia

Setor administrativo, refeitório

Vestiários na quadra

Telhado feito com estrutura metálica

Contrato: 135/2020

Valor: R\$ 1.465.164,25

VALOR PAGO – 18%

1ª Medição - R\$119.991,79

2ª Medição - R\$147.973,65



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal **PRESIDENTE COSTA E SILVA**

08 salas de aula (01 nova)

Biblioteca, informática e robótica, refeitório, sala de recursos

Setor administrativo

Contrato: 134/2020

Valor: R\$ 767.024,78

VALOR PAGO – 15% da obra

1ª Medição - R\$36.999,50

2ª Medição - R\$ R\$74.254,44



REFORMA E AMPLIAÇÃO

Escola Municipal **IPIRANGA**

Elevação do piso e paredes

07 salas de aula

Sala de recursos, informática e robótica, biblioteca

Setor administrativo, refeitório

Contrato: 142/2020

Valor: R\$ 605.444,98

VALOR PAGO – 31% da obra

1ª Medição – 191.375,49



AQUISIÇÃO – FORRO PVC

Contrato: 57/2020

Valor: R\$ 589.453,73

VALOR JÁ PAGO

1º Medição – 88.330,50

2º Medição – 162.495,26

3º Medição – 138.263,80

4º Medição – 124.400,67

5º Medição – 71.270,46



ESCOLAS JÁ FORRADAS

URBANA

Madalena de Canossa – Sta Lúcia

Pedro Abreu – Vila Fiquene

São Jorge I - Vilinha

Maria evangelista – Itamar Guará

José de Queiroz – Vila Vitória

Santa Tereza – São José

Mariana luz – Santa Rita

Raimundo Corrêa – Bom Sucesso

Marcionília Gomes Soares - Camaçari

João Lisboa - Cacauzinho

Princesa Isabel – Entroncamento

Wady Fiquene – São João Batista

RURAL

Raimundo Ribeiro – Vila Machado

Juscelino Kubitscheck – Petrolina

Nossa senhora de Nazaré – Lagoa Verde

Senhor Jesus – Vila Conceição

Afonso Pena – Km 1.700

Moreira neto – Lagoa Verde

Chaparral – Faz. Chaparral

Bernardo Sayão – Riacho do Meio

Coelho Neto – BR 010

João Guimarães – BR 010 – entrada da 1.200

João Gonçalves Santiago – Jibóia

Tomé de Souza - Olho D'água

Humberto de Campos -

Enock Alves Bezerra – Imbiral

Dom Pedro I – Coquelândia

Dom Marcelino – Coquelândia

São Félix – São Félix

AQUISIÇÃO – ENERGIA SOLAR

28 sistemas com painéis fotovoltaicos instalados em 37 espaços

31 escolas e 06 quadras poliesportivas

85% de evolução (Falta instalar em 06 escolas em reforma)

Fatura mensal atual – **R\$311. 775,59**

Economia mensal prevista – **R\$285.000,00**

Economia anual – **R\$3.420.000,00**

(Custo-benefício em economia e conforto com a climatização)

Contrato: 972/2020

Valor: R\$ 10.153.819,07

VALOR PAGO – 84% do contrato

1ª Medição – 812.305,53

2ª Medição - 4.061.527,63

3ª Medição – 3.178.145,37



ESCOLAS COM ENERGIA FOTOVOLTAICA

INSTALADOS

Juracy A Conceição

Sousa Lima

Tiradentes II

Quadra Tiradentes II

Sta Teresa D Avila

Maria Das Neves

Quadra Maria das Neves

Madalena de Canossa

Quadra Madalena Canossa

Machado de Assis

Castro Alves I

Emei Jackson Iago

Wady Fiquene

Pedro Abreu

Tocantins

Prof. Jose de Queiroz

Quadra José Queiroz

Frei Tadeu

Quadra Frei Tadeu

Emei Eldevira Marques

Mariana Luz

Marcionília Gomes

Emei Shirley Farias

Domingos Moraes

Emei Jair Rosignoli

Moreira Neto

Morada do Sol

São Jorge I

Manoel Ribeiro

FALTA INSTALAR

Escola Mun. Giovanni Zanni

Escola Mun. Elisa Nunes

Quadra Elisa Nunes

Escola Mun. Darcy Ribeiro

Paulo Freire

Quadra Paulo Freire

Emei José Ribamar Garros

Telasco P. Filho – Bilingue

AQUISIÇÃO – CLIMATIZAÇÃO

Aquisição de **600** aparelhos de ar-condicionado modelo Split de 12, 18, 24, 30.000 BTUS


Incluindo serviço de **instalação** das máquinas nas escolas

Contrato: 906/2019

Valor: R\$ 2.083.000,00

600 aparelhos entregues

VALOR PAGO – liquidado

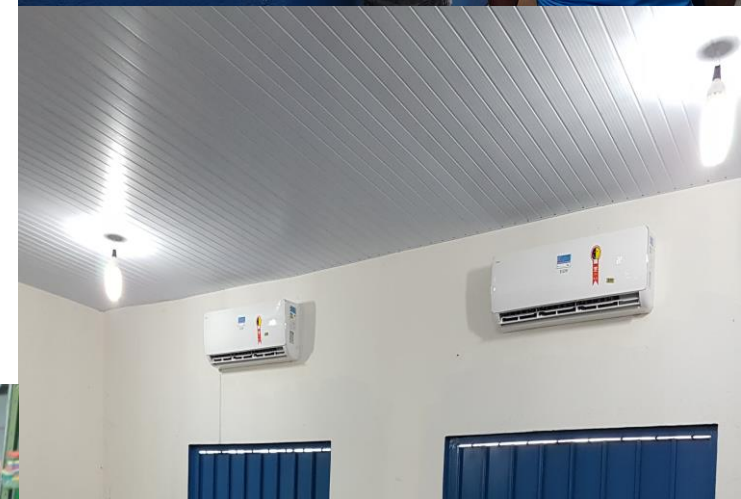

EVOLUÇÃO DA CLIMATIZAÇÃO

JÁ INSTALADOS

José de Queiroz - **29**

Wady Fiquene - **26**

Mariana Luz - **14**

Maria das Neves - **27**

Maria Evangelista - **29**

Raimundo Correa - **15**

São Jorge I - **11**

Santa Teresa - **14**

Marcionília Gomes - **16**

Sousa Lima – **8**

Gonçalves Dias – **10**

•**Total parcial: 11 escolas**

•**119 salas**

•**214 equipamentos**

PREVISTO

Madalena de Canossa

João Lisboa

Raimundo Ribeiro

Juscelino Kubitscheck

Nossa senhora de Nazaré

Senhor Jesus

Afonso Pena

Moreira Neto

Chaparral

Bernardo Sayão

Coelho Neto

João Guimarães

João Gonçalves Santiago

Tomé de Souza

Humberto de Campos

Enock Alves Bezerra

Dom Pedro I

São Félix

Dom Marcelino – Completar

Princesa Isabel

Pedro Abreu

AQUISIÇÃO 50 LABORATÓRIOS DE ROBÓTICA

Contrato: 04/2020

Valor: R\$ 985.000,00 (11 laboratórios)

Contrato: 52/2020

Valor: R\$ 3.494.400,00 (39 laboratórios)

Incluindo a **capacitação dos servidores** para manuseio nas escolas

Assistência técnica



ESCOLAS BENEFICIADAS

ZONA URBANA

1. Adalberto Franklin
2. Castro Alves I
3. Costa e Silva
4. Darcy Ribeiro
5. Dom Afonso
6. Domingos Morais
7. Eliza Nunes
8. Frei Manoel Procópio
9. Frei Tadeu
10. Giovanni Zanni
11. Guilherme Dourado
12. Ipiranga
13. João Silva
14. José Queiroz
15. Leôncio Pires Dourado

16. Machado de Assis
17. Madalena de Canossa
18. Maria das Neves
19. Maria Evangelista
20. Mariana Luz
21. Marly Sarney
22. Morada do Sol
23. Mutirão
24. Parsondas de Carvalho
25. Paulo Freire
26. Pedro Abreu
27. Raimundo Corrêa
28. Renato Cortez Moreira
29. Santa Laura
30. Santa Tereza Dávila
31. Santos Dumont

32. Sinopse
33. Sucesso da Criança
34. Tiradentes
35. Tocantins
36. Wady Fiquene

ZONA RURAL

1. Juscelino Kubitschek
2. Marcionília Gomes Soares
3. Moreira Neto
4. Tomé de Sousa

PACOTE DE MANUTENÇÃO

Contrato: 147/2020

Valor global: R\$ 12.128.566,66

Primeira medição – 1.473.818,93

MELHORIA DE 26 PRÉDIOS

Inclusa nos Serviços de engenharia para Manutenção Preventiva (visita periódica) e Corretiva (serviços eventuais), com fornecimento de peças e materiais, nos sistemas, equipamentos e instalações nos prédios públicos da SEMED.

MANUTENÇÃO - ESCOLAS BENEFICIADAS

Marcionília Gomes – Camaçari
Santa Laura – Bacuri
Juscelino Kubitschek - Petrolina
Dom Marcelino - Coquelândia
Domingos Moraes – Recanto Universitário
Machado de Assis – Vila Nova
Pedro Abreu – Vila Fiquene
José Queiroz – Vila Vitória
Mariana Luz – Santa Rita
Maria das Neves – Alto Bonito
Maria Evangelista – Itamar Guará
Princesa Isabel - Entroncamento
Tiradentes – Parque Buriti
Madalena de Canossa – Vila Nova

Frei Tadeu - Vilinha
Marechal Rondon – Nova Imperatriz
Castro Alves – Vila Lobão
Raimundo Corrêa – Bom Sucesso
Nossa Senhora de Nazaré – Lagoa Verde
Santa Tereza - Parque São José
Santa Teresa Dávila - Cafeteira
Bernardo Sayão - Riacho do Meio
Santo Amaro – Matança
Wady Fiquene – Nova Imperatriz
Raimundo Ribeiro - V. Machado
Tomé de Sousa - O. D'Água dos Martins

PACOTE DE MANUTENÇÃO

JÁ CONCLUÍDA

Escola Marcionília Gomes Soares

Inaugurada em 26 de junho



PACOTE DE MANUTENÇÃO

FASE DE CONCLUSÃO

Escola Pedro Abreu



PACOTE DE MANUTENÇÃO

70% EXECUTADO

Juscelino Kubitschek - Petrolina



PACOTE DE MANUTENÇÃO

Maria Evangelista de Sousa



PACOTE DE MANUTENÇÃO

Escola Princesa Isabel



PACOTE DE MANUTENÇÃO

Escola Professor **José Queiroz**



EM LICITAÇÃO

- Reforma e ampliação do **Parsondas de Carvalho** com quadra coberta – Ouro Verde
- Reforma da Escola **Marly Sarney** com pátio coberto – Vila Redenção
- Reforma da Escola **Giovanni Zanni** com pátio coberto – Centro
- Ampliação da Emei **Shirley Farias** com duas novas salas – Vila Mariana
- Acervo de 100 **bibliotecas** – em fase de conclusão
- **50 subestações de energia elétrica.**

NA FASE DE PROJETO

Creche ao lado da escola **Darcy Ribeiro** – Parque São José

12 salas de aula – capacidade 400 crianças



NA FASE DE PROJETO

Creche do **Habitar Brasil** – 07 salas de aula
capacidade 250 crianças




NA FASE DE PROJETO

Creche ao lado da escola

Morada do Sol

08 salas de aula

Capacidade 300 crianças

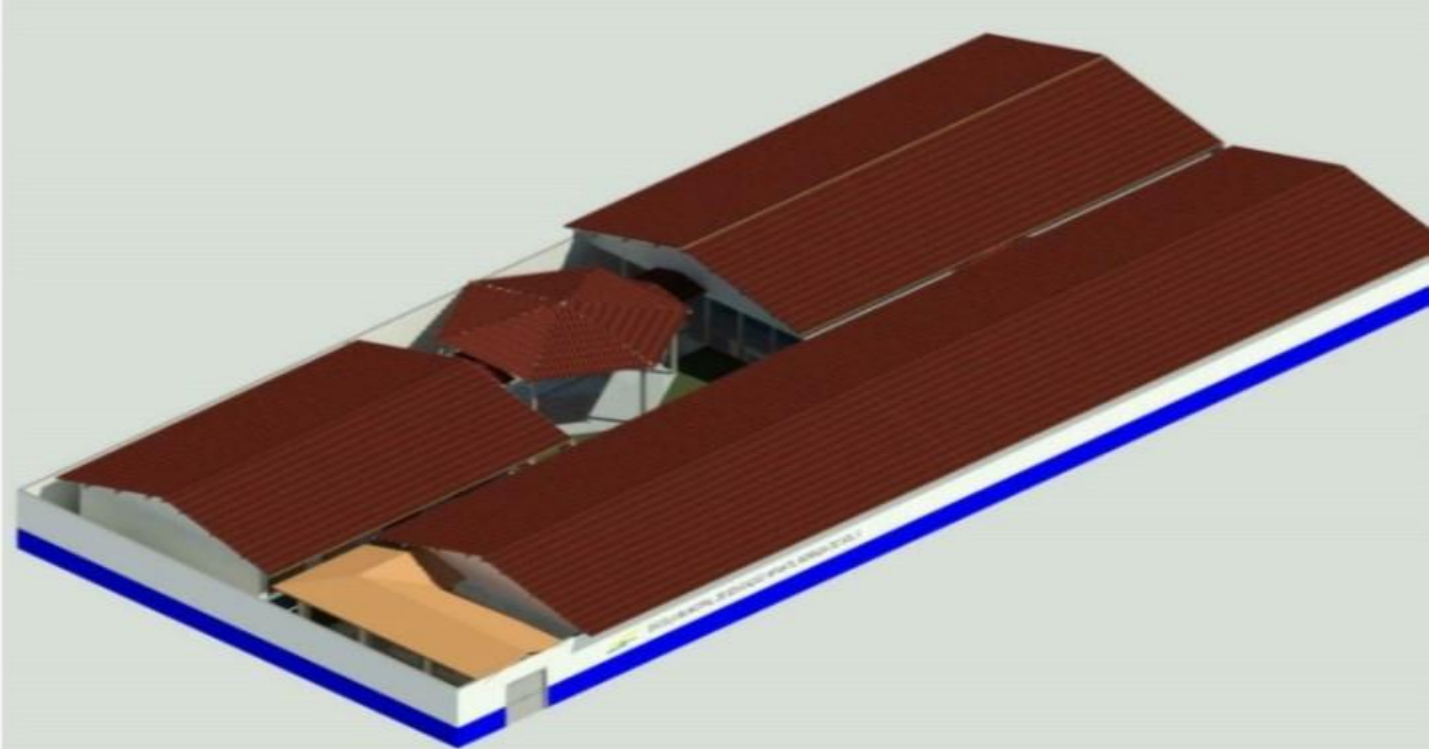


NA FASE DE PROJETO

Ampliação da Emei **Jackson Lago** – mais 10 salas de aula – 200 novas vagas



NA FASE DE PROJETO

Reforma da Escola Municipal **Paulo Freire**

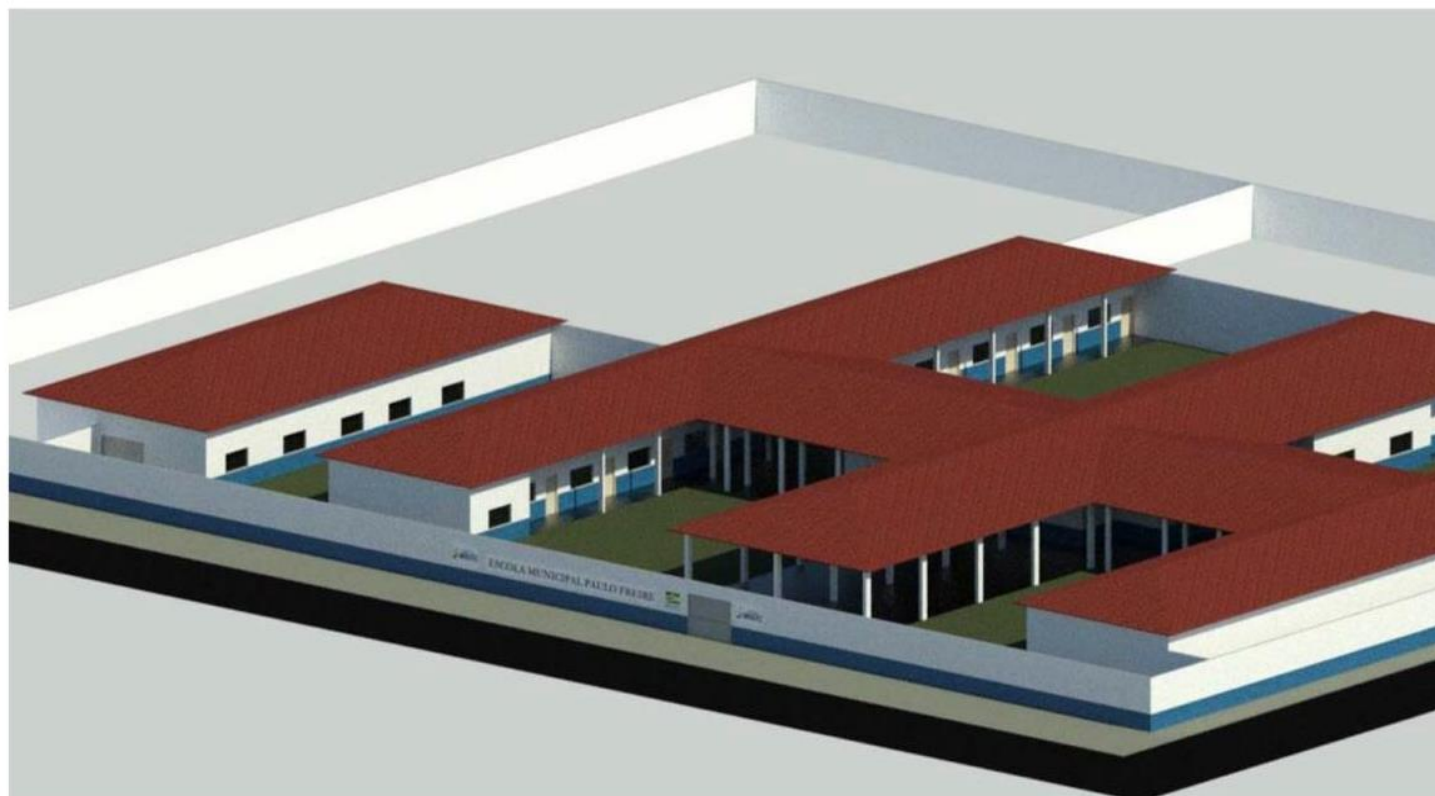

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Contrato nº: 982/2020

Valor: 596.200,00

Pago: 121.500,00

Aquisição de 45 Geladeiras

Entregues nas escolas 39

Em estoque: 06

Estimativa de novas aquisições: 100 unidades



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO

Contratos n°: 984/2020

Valor: 661.220,00

Pago: 387.245,00

- 51 bebedouros inox – (31 entregues/ 20 em estoque)
- Previsão de novas aquisições – 80 unidades
- 250 purificadores de água
(31 entregues/219 em estoque)
- 1.000 refis para purificadores (total em estoque)



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO

Contratos nº: 984/2020

Valor: 661.220,00

Pago: 387.245,00

- 51 Mesas para escritório com duas gavetas
(33 entregues/ 18 em estoque)
- 01 armário arquivo de aço (em estoque)
- 01 armário de aço duas portas (em estoque)



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Contratos n°: 985/2020

Valor: 546.000,00

Pago: 223.200,00

- 90 freezers modelo horizontal duas portas (17 entregues/ 73 em estoque)
- Previsão de novas aquisições (80 unidades)



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

Contratos nº: 987/2020

Valor: 163.022,00

Pago: 163.022,00

- 150 Panelas de pressão (20L)
(35 entregues/ 115 em estoque)
 - 20.000 pratos
(4.222 entregues/ 15.778 em estoque)
 - 300 kits de tábuas
(146 entregues/ 154 em estoque)
- Previsão de novas aquisições – (200 unidades)



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

Contratos n°: 989/2020

Valor: 340.350,00

Pago: 305.350,00

- 150 liquidificadores industriais (06L)
(25 entregues/ 125 em estoque)
- 200 cadeiras giratórias
(42 entregues/ 158 em estoque)
- 150 fogões industriais
(05 entregues/ 145 em estoque)



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Contrato nº: 54/2020

Valor R\$ 4.450.095,00

Contrato liquidado

Mobiliário escolar

- 3.500 Conj. de mesas e carteiras (alunos)

(1.647 entregues/ 1.853 em estoque)

Previsão de novas aquisições (5.000 unidades)

- 850 conj. Mesa e cadeira (professor)

(250 entregues/ 600 em estoque)



AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES

Contrato nº: 54/2020

Valor R\$ 4.450.095,00

Contrato liquidado

Mobiliário escolar

- 190 Conj. Mesas e cadeiras para refeitórios
(10 entregues/ 180 em estoque)
Previsão de novas aquisições (200 kits)
- 150 Armários
(12 entregues/ 138 em estoque)
- 140 Estantes para biblioteca
(12 entregues/ 128 em estoque)



**TOTAL DE PAGAMENTOS REALIZADOS DA CONTA
FUNDEF**

R\$ 26.309.395,20

VALOR RECEBIDO DO FUNDEF 2019

R\$ 102.572.355,35

Agendamento de Resgate Precatório Federal

Numero de Protocolo : 00000000043762628
Processo : 00005097620044013701
Numero do Alvará : SEM ALVARA
Data do Alvará : 16/09/2019
Data do Levantamento : 16/09/2019
Beneficiário : MUNICIPIO DE IMPERATRIZ
CPF/CNPJ : 06.158.455/0001-16
Agência do Resgate : 3846 S.PUBLICO SAO LUIS

DADOS DO RESGATE

Valor do Capital	: R\$	100.892.410,66
Valor dos Rendimentos	: R\$	1.679.944,69
Valor Bruto Resgate	: R\$	102.572.355,35
Valor do IR	: R\$	0,00
Valor Líquido Resgate	: R\$	102.572.355,35

DADOS DO CRÉDITO

Finalidade : Crédito em C/C BB
Banco : Banco do Brasil S.A.
Agência : 0554
Conta : 0096118-3
Titular da Conta : SECRETARIA MUNICIPAL DE E
CPF/CNPJ : 06.074.091/0001-96
Valor Líq. Pagamento : R\$ 102.572.355,35
Previsão do Pagamento: 16/09/2019
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Fonte Pagadora : Banco do Brasil S.A.
CNPJ : 00.000.0000/0001-91
Código de Retenção : 5928
Conta Resgatada : 4600131571665
=====

Autenticação Eletrônica: 659352DDCC52E327

Valores sujeitos a alterações até o efetivo processamento do resgate.

Acesse seus comprovantes diretamente no site www.bb.com.br, no menu Judiciário > Serviços Exclusivos > Depósito Judicial > Comprovantes. Clientes BB também podem acessar no Autoatendimento Pessoa Física e Gerenciador Financeiro.

SALDO – FUNDEF - CEF

CAIXA

Agência 0644 Operação 006 Conta 00071084-0

Meu Saldo
R\$ 73.196.003,00

Sair



contas de governo



transações



pagamentos



transferências



serviços judiciais



transações em lote



investimentos



empregador



transmissão de arquivos



senhas e configurações



Extrato

Horários e Limites

Saldo	73.196.003,00 C
Limite do Cheque Especial	0,00
Saldo bloqueado	0,00 C
Saldo disponível	73.196.003,00 C
Saldo total	73.196.003,00 C

* 650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

SALDO FUNDEF - BB

R\$ 3.992.795,83

Agência e Conta						
Agência:	554 EMPRESA IMPERATRIZ MA	Conta:	96118	Cliente:	SEMED IMPERATRIZ	
Período do Extrato						
<input type="radio"/> Mês atual a partir do dia:	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Meses anteriores:	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Últimos 30 dias	<input checked="" type="radio"/> De:	03/07/2020
					Até:	08/07/2020
Consultar						
Lançamentos						
Data	Balancete	Histórico	Origem	Documento	Lote	Valor
30/12/2019		Saldo Anterior em 30/12/2019				0,00 C
		Não há lançamentos				
Invest.com Resgate Autom.						3.992.795,83 C
Saldo						3.992.795,83 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						03/08/2020
Saldo em Aplicação Financeira						
S.Público Automático						3.992.795,83
Empréstimos e Financiamentos			Vantagens			

SALDO ATUALIZADO – PRECATÓRIO FUNDEF

Saldo inicial em 16/09/2019: **R\$ 102.572.355,35**

Total de pagamentos realizados: - **R\$ 26.309.395,20**

Aplicação financeira: **922.839,00**

Conta CEF R\$ 73.193.003,00

Conta BB R\$ 3.992.795,83

Saldo em conta R\$ 77.185.798,83



PREFEITURA DE
IMPERATRIZ
